
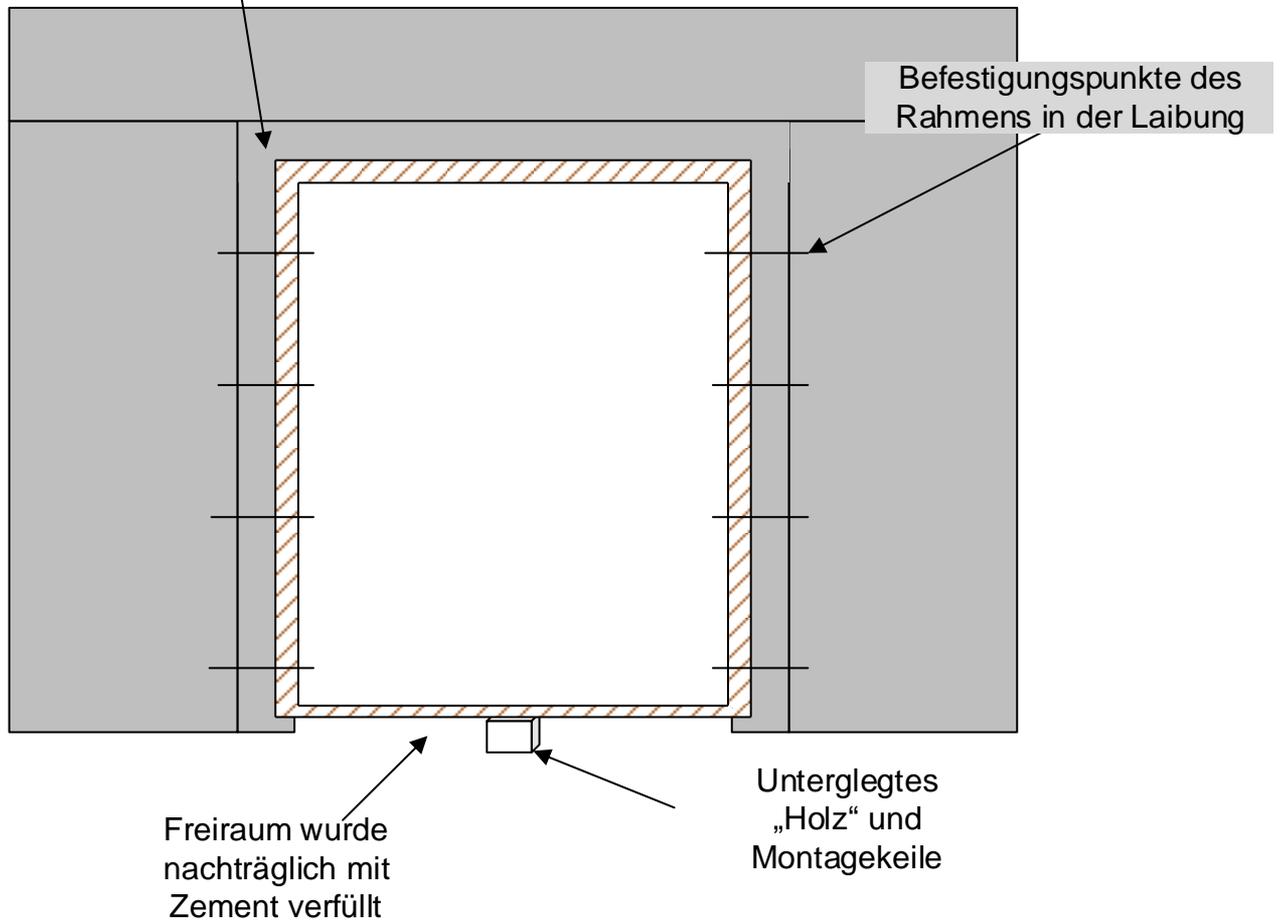




Kellertür (nicht Maßstabsgetreu)

Freiraum wurde ausgeschäumt und
verputzt

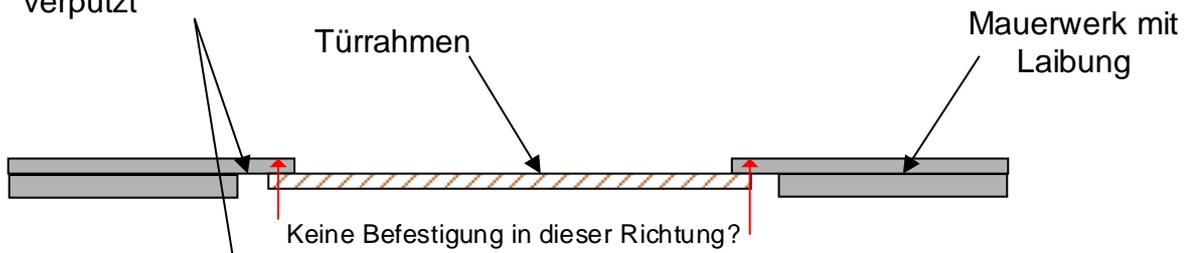

- kein Formschluss zwischen Türrahmen und Mauerwerk an den Befestigungspunkten (Rahmen wird verspannt, kein Anschlag)
- keine Verschraubung nach oben oder unten
- kein Unterbau unter Türrahmen, nur „Hölzchen“ in der Mitte der Türschwelle
- keine Befestigungspunkte in Richtung Hausinnenseite/Mauer

Terrassentür
(nicht Maßstabsgetreu)

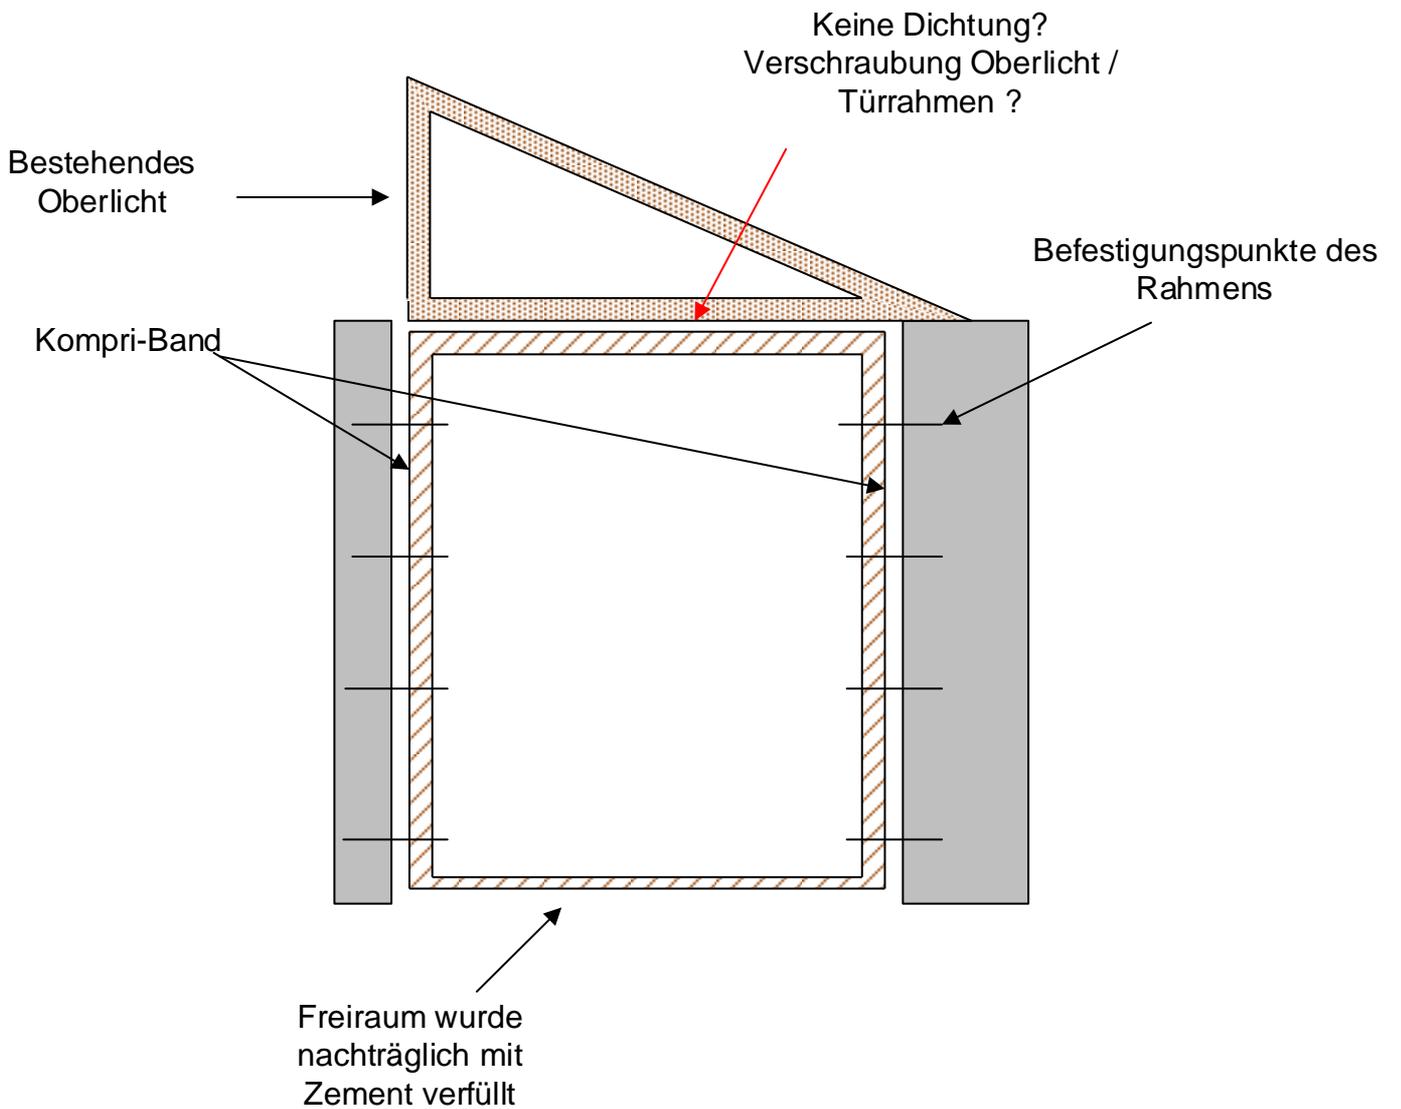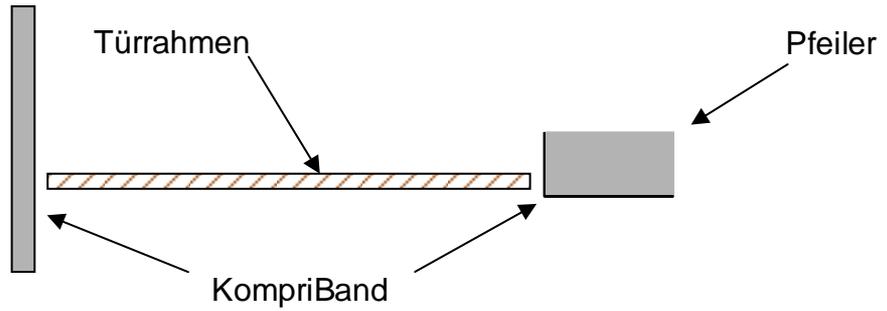

- kein Formschluss zwischen Türrahmen und Mauerwerk an den Befestigungspunkten (Rahmen wird gespannt, kein Anschlag)
- keine Verschraubung nach oben oder unten
